


FASE 1:




-Rimozione del guard rail esistente e posizionamento new jersey provvisori.

FASE 2:

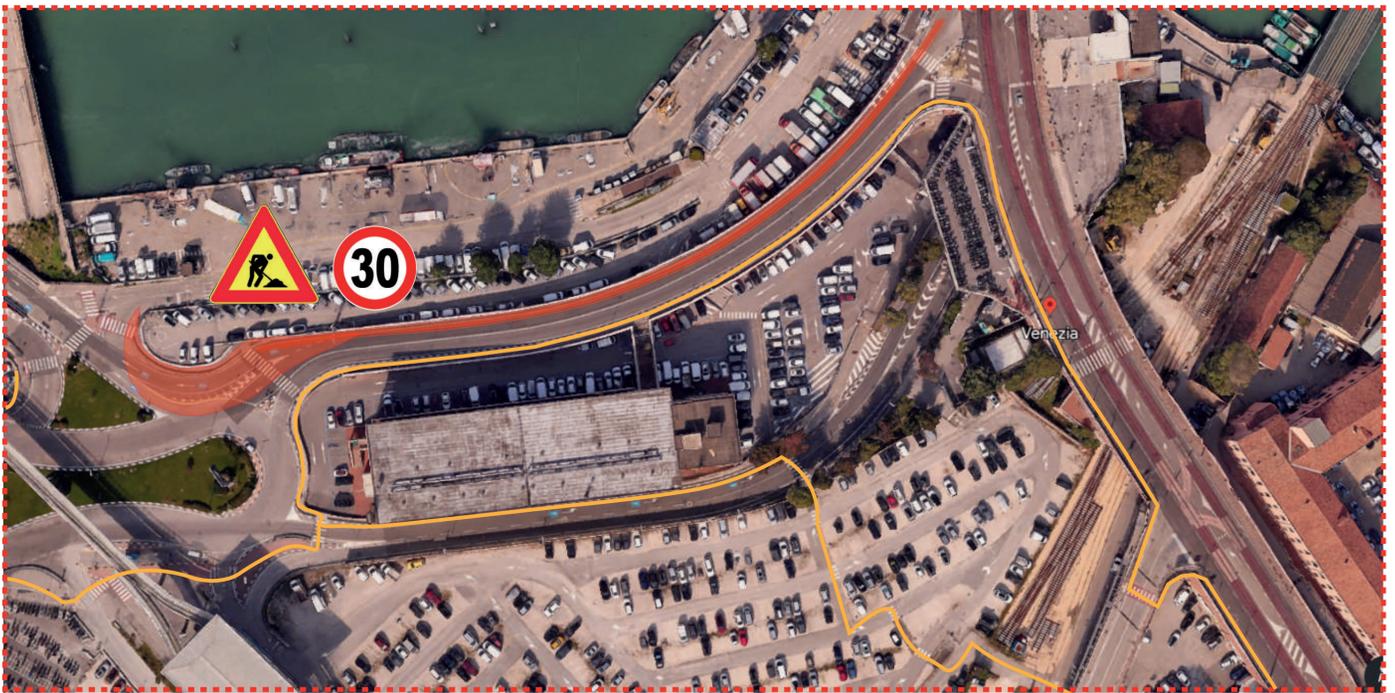


-Riempimento e resinatura acrilica colorata della pista ciclabile con successiva realizzazione della segnaletica orizzontale.
-la linea gialla indica il flusso pedonale.

FASE 3:

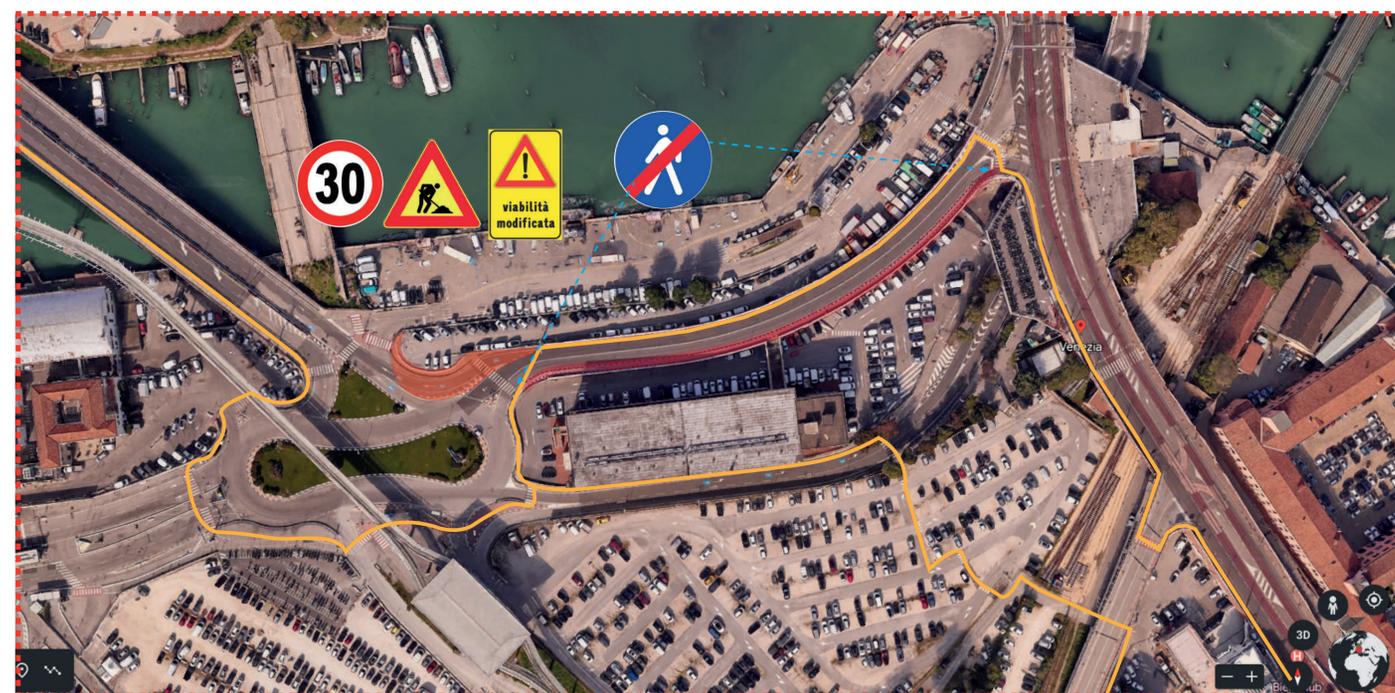

-Fresatura e asfaltatura del marciapiede laterale.
-Flusso pedonale indirizzato sulla pista ciclabile (linea gialla).

FASE 4:

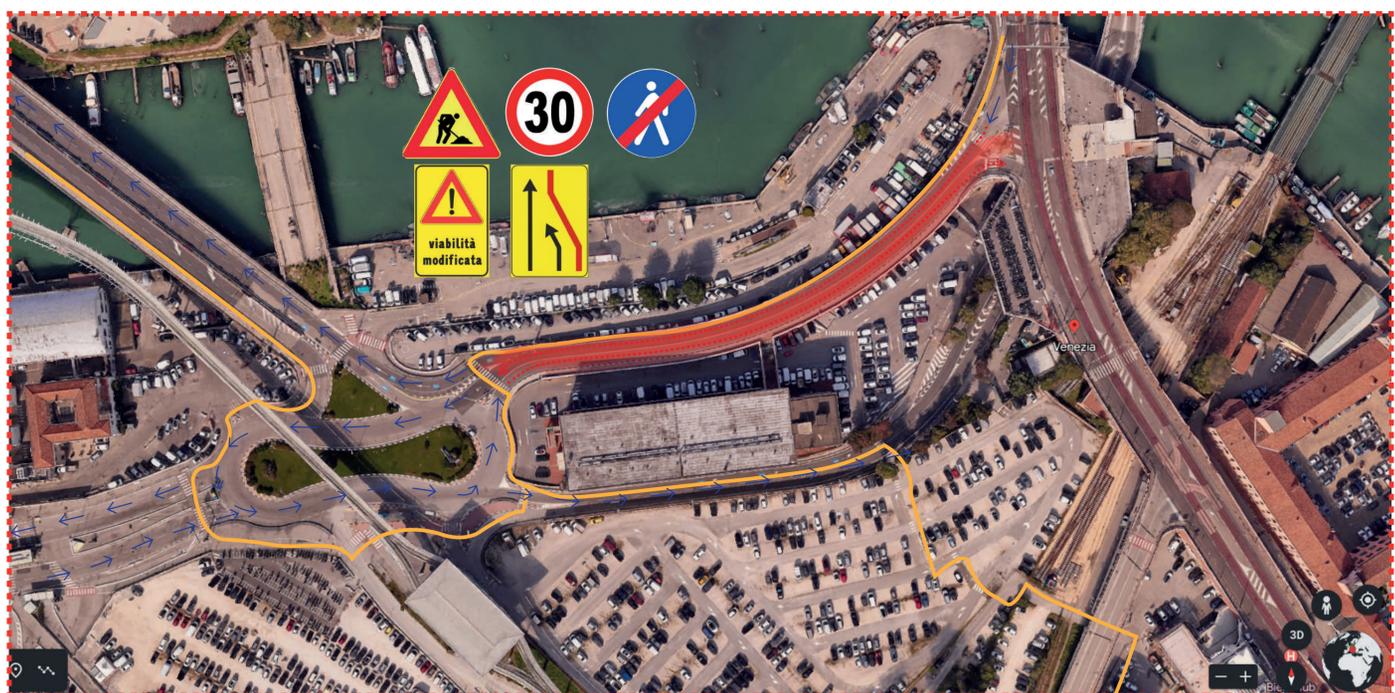

-Asfaltatura della carreggiata stradale con successivo rifacimento della segnaletica orizzontale.
-Senso unico alternato con moviere per regolamentare i flussi .
-Flusso pedona
